

ICAR

Comitato Interregionale di Coordinamento e Gestione

Roma, 23 aprile 2009

Agenda


- ❁ SAL al 31 Marzo 2009;
- ❁ Azioni finali: contenuti e costi;
- ❁ Servizi di manutenzione ed assistenza post ICAR: prime ipotesi;
- ❁ Evento di chiusura Progetto (giugno 2009);
- ❁ Varie ed eventuali.

SAL X TRIMESTRE

Nel corso del trimestre (giugno-settembre 2008) l'attività interregionale è proseguita nella gestione e implementazione delle attività previste dalla progettazione esecutiva dei diversi task, ed in particolare del secondo ciclo di progettazione:

- ❁ rilasci definitivi da parte dei task infrastrutturali;
- ❁ collaudi con le Regioni;
- ❁ conclusione dello sviluppo delle interfacce applicative, delle modalità di interazione con le porte di dominio;
- ❁ conclusione dei rilasci degli accordi di servizio, dei servizi di cooperazione e relativi test.

Task AP 1


-  Il task **AP-1** (Compensazioni sanitarie - con capofila la Regione Basilicata) ha avviato le attività di test per l'integrazione dei servizi rilasciati. Nella fase attuale, tutte le Regioni aderenti al task stanno provvedendo ad adeguare i propri sistemi informativi sanitari. L'adeguamento evidenzia differenti livelli di avanzamento a seconda dei contesti regionali.

Task AP 2



Il task **AP-2** (Anagrafi - con capofila la Regione Toscana) ha ripreso i lavori del tavolo sulla circolarità anagrafica istituito presso il CNIPA, in cui sono parti attive il Ministero dell'Interno e alcune Regioni ICAR, dando evidenza alle istanze di accelerazione del processo di stipula delle convenzioni, rispetto al piano di attività definito a Napoli che prevedeva come primo step la qualificazione SPC della porta di dominio CNSD del Ministero dell'Interno. Pertanto, lo scorso 2 aprile a Rimini sono state stipulate le convenzioni tra il Ministero dell'interno e le Regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria, Veneto ed Emilia Romagna. Alla stipula delle convenzioni seguirà l'attivazione di tavoli tecnici regionali (presso le Prefetture dei Comuni capoluogo di Regione) e di un comitato di indirizzo interregionale.

Intanto sono state avviate le prime attività di verifica dell'interoperabilità fra la porta di dominio CNSD e le regioni sperimentatrici.

Task AP 3

-  Il task AP-3 (Aree Organizzative Omogenee - con capofila la Regione Friuli Venezia Giulia) ha provveduto alla messa a punto dell'applicazione di front-end sul sistema previsto per i test e alla sincronizzazione dei servizi realizzati dalla Regione FVG esposti sul NICA regionale, con i NICA della Regione Basilicata (sito Università) e della Regione Puglia. Con questa ultima ha, poi, iniziato i test sui servizi. Grazie all'applicazione di front-end rilasciata, ciascuna Regione è in grado di eseguire i test dei servizi documentali realizzati sul proprio sistema dapprima in loop-back su sé stessa e poi interagendo con le altre Regioni partner del task.

Task AP4 e AP 5

-  Il task AP-4 (Lavoro - con capofila la Regione Friuli Venezia Giulia) ha provveduto ad approfondire la specifica ministeriale della scheda anagrafico-professionale, sulla base di un insieme di modifiche proposte alle versioni precedenti e raccolte in un insieme di documenti, per rilasciare a breve una nuova versione. La Regione FVG ha perciò aggiornato la propria implementazione del servizio adeguandolo alle ultime modifiche concordate, in modo da poter effettuare nel prossimo trimestre i test sulla nuova versione.
-  Il task AP 5 (Bollo auto – con capofila la Regione Piemonte) prosegue nelle attività secondo i tempi previsti dal piano di progetto. Attualmente è al termine della fase di realizzazione (fase C).

Task AP 6

- ❁ Il task Ap6 (Osservatorio Carburanti – con capofila la Regione Liguria) ha proseguito le attività di progettazione esecutiva e realizzazione (macro fase A5) del portale interregionale; e di test di validazione (macro fase A6). Ha inoltre provveduto ad adeguare i sistemi regionali di osservatorio (delle Regioni aderenti), sperimentando il colloquio in cooperazione applicativa con l'osservatorio interregionale, comprensivo di tutti i servizi previsti (titolari, impianti, erogato e rilevazione servizi). In particolare, con Lombardia, Emilia – Romagna e Lazio sono ancora in corso la definizione dei colloqui in cooperazione applicativa e l'adeguamento dei sistemi regionali di osservatorio.

Task AP 7

- ❁ Il task Ap 7 (Banche dati Cisis-Cinsedo – con capofila la Regione Lombardia) si trova attualmente nella fase di sviluppo dei moduli di interfacciamento con i sistemi informativi regionali da parte delle singole Regioni aderenti.

A seguito delle difficoltà nello start-up il task ha accumulato un ritardo di tre mesi che ha comportato lo slittamento della fase di validazione della implementazione di riferimento a settembre 2008; e la sospensione delle attività afferenti il “Raccordo con altri Task AP” per l’elevata complessità dei tracciati di interscambio oggetto dei rilasci degli altri Task applicativi ICAR.


Task INF 1

- INF1 (Infrastruttura di base – con capofila la Regione Toscana) ha completato i due cicli previsti ed avviato il terzo ed ultimo ciclo. Nella fattispecie sono state rilasciate tre versioni della Porta di Dominio e una versione del Registro SICA secondario. L'ultimo rilascio a conclusione della terza fase conterrà i servizi di sincronizzazione dei Sica Secondari con il Sica Nazionale, secondo le specifiche rilasciate dal Cnipa a fine 2008.

Task INF 2

- ❁ Il task INF 2 (SLA – con capofila la Regione Liguria) in raccordo con i tempi del task INF 1 - dopo aver provveduto a consegnare i pacchetti della reference implementation alle Regioni e organizzato con le capofila infrastrutturali Toscana, Liguria e Piemonte l'incontro di collaudo -, sta provvedendo alla sperimentazione. Il terzo e conclusivo rilascio sarà integrato col quarto rilascio del task INF-1. Quest'ultimo, a causa della ritardata possibilità di mettere a punto l'armonizzazione tra i registri secondari ed il registro primario SICA, sarà effettuato con uno slittamento che posticiperà la conclusione della terza iterazione "Realizzazione e Test" attualmente in corso.

Task INF 3


-  Il task INF 3 (Identità federata – con capofila la Regione Piemonte) procede nel rispetto dei tempi previsti si trova al 90% della fase di realizzazione e al 80% della fase di completamento. Nell'ultimo trimestre non ha rilasciato alcun deliverable.

In sintesi


TASK	CRONOGRAMMA	CRITICITA'
INF 1	Allineato ai tempi ripianificati	Nessuna
INF 2	Allineato ai tempi ripianificati	Nessuna
INF 3	Allineato ai tempi di progetto	Nessuna
AP 1	Allineato ai tempi di progetto	Nessuna
AP 2	Allineato ai tempi ripianificati	Complessità tecnologica/organizzativa
AP 3	Allineato ai tempi ripianificati	Nessuna
AP 4	Allineato ai tempi ripianificati	Nessuna
AP 5	Allineato ai tempi di progetto	Nessuna
AP 6	Allineato ai tempi ripianificati	Nessuna
AP 7	Allineato ai tempi ripianificati	Nessuna

Per tutti i task applicativi è necessario verificare il grado di adeguamento delle singole Regioni

Gantt dei Task INF

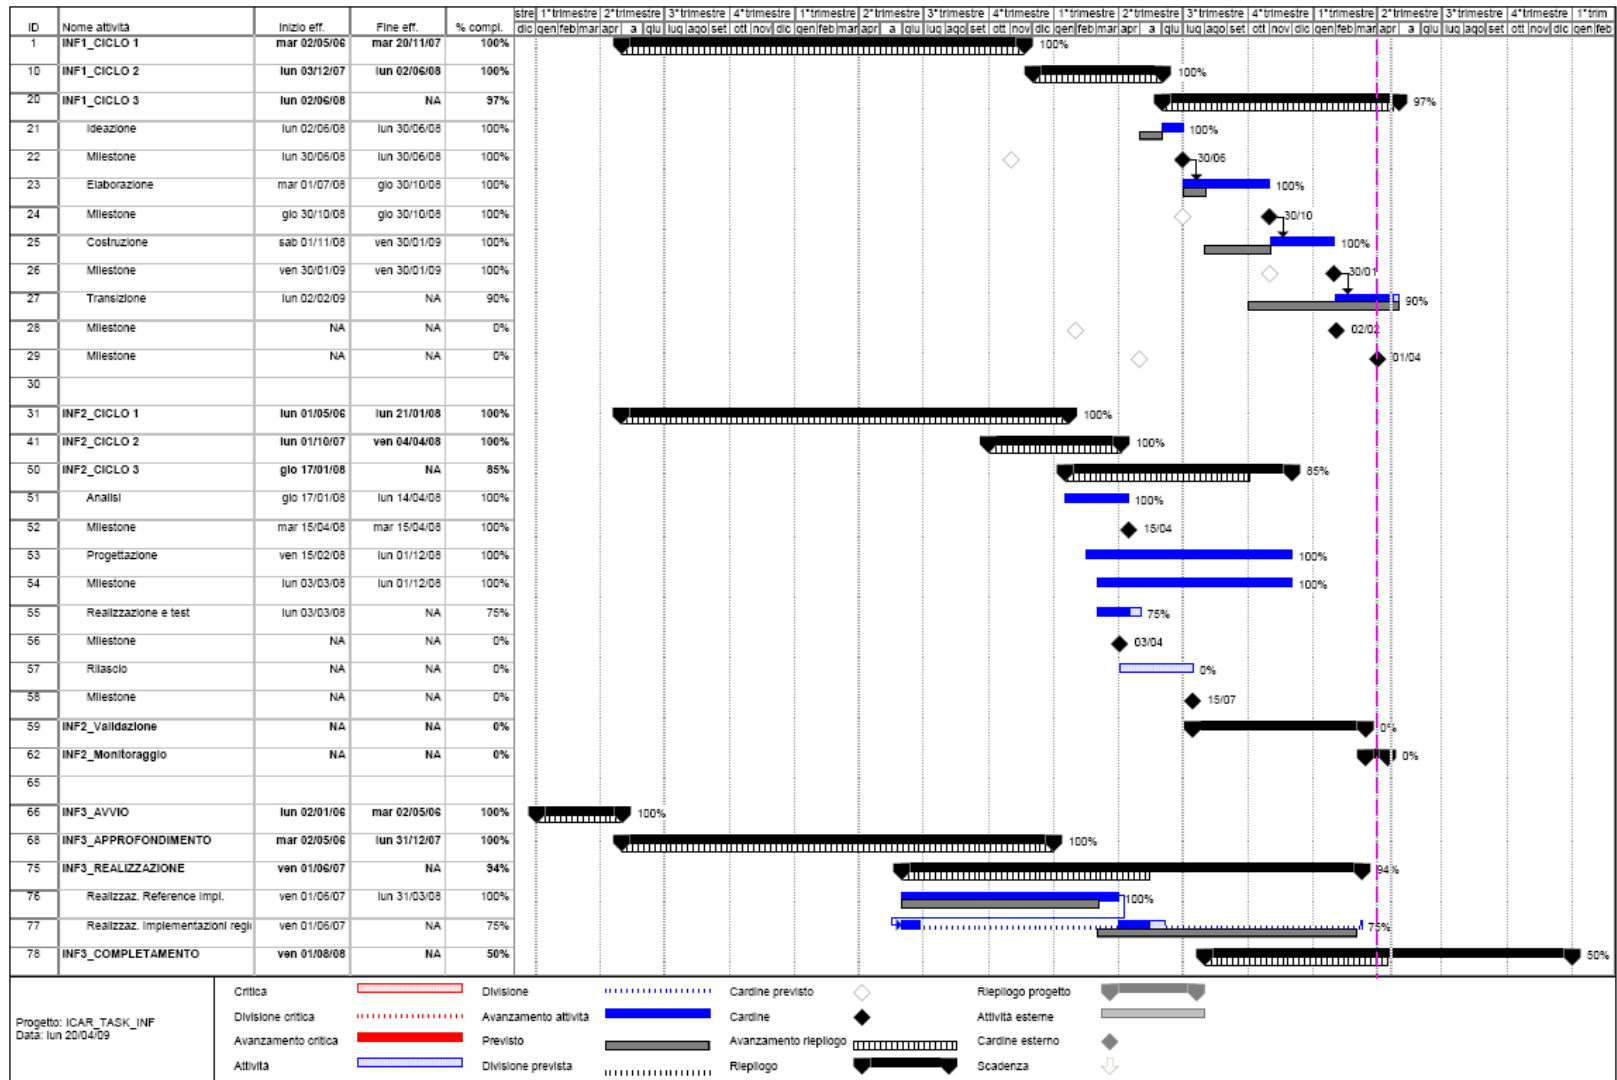

Gantt dei Task AP

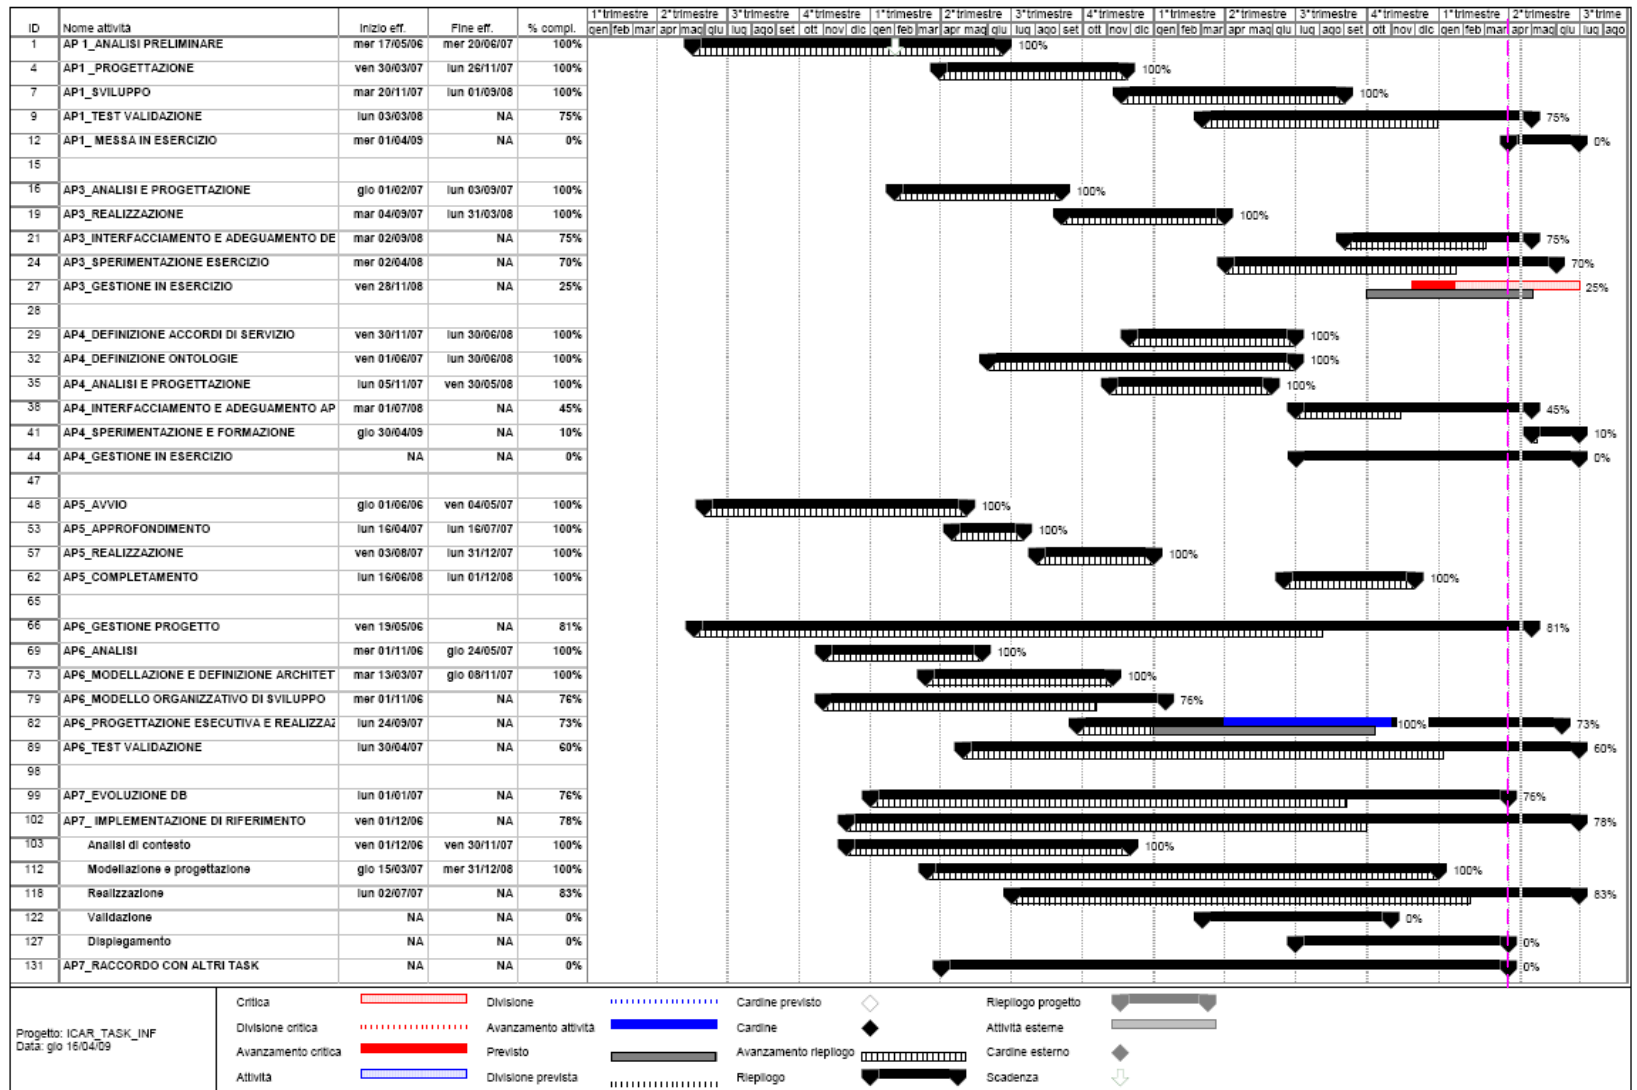

Riepilogo Task INF1

TASK	INIZIO	FINE	INIZIO Previsto	FINE Prevista	% COMPL.
INF1_CICLO 1	mar 02/05/06	mar 20/11/07	mar 02/05/06	gio 01/05/08	100%
INF1_CICLO 2	lun 03/12/07	lun 02/06/08	lun 01/10/07	gio 01/05/08	100%
INF1_CICLO 3	lun 02/06/08	ven 01/05/09	lun 01/10/07	ven 01/05/09	97%
Ideazione	lun 02/06/08	lun 30/06/08	gio 01/05/08	dom 01/06/08	100%
Milestone	lun 30/06/08	lun 30/06/08	ven 02/11/07	ven 02/11/07	100%
Elaborazione	mar 01/07/08	mer 30/07/08	mar 01/07/08	ven 01/08/08	100%
Milestone	lun 03/11/08	lun 03/11/08	mar 01/07/08	ven 01/08/08	100%
Costruzione	lun 03/11/08	ven 30/01/09	ven 01/08/08	sab 01/11/08	100%
Milestone	ven 30/01/09	ven 30/01/09	sab 01/11/08	sab 01/11/08	100%
Transizione	lun 02/02/09	ven 01/05/09	mer 01/10/08	ven 01/05/09	90%
Milestone	lun 02/02/09	lun 02/02/09	ven 01/02/08	gio 01/05/08	0%
Milestone	mer 01/04/09	mer 01/04/09	gio 01/05/08	ven 01/05/09	0%

Riepilogo Task INF2

TASK	INIZIO	FINE	INIZIO Previsto	FINE Prevista	% COMPL.
INF2_CICLO 1	lun 01/05/06	lun 21/01/08	lun 01/05/06	mer 03/10/07	100%
INF2_CICLO 2	lun 01/10/07	ven 04/04/08	lun 01/10/07	gio 17/01/08	100%
INF2_CICLO 3	gio 17/01/08	mar 15/07/08	gio 17/01/08	mar 15/07/08	85%
Analisi	gio 17/01/08	lun 14/04/08	NA	NA	100%
Milestone	mar 15/04/08	mar 15/04/08	NA	NA	100%
Progettazione	ven 15/02/08	lun 01/12//08	NA	NA	100%
Milestone	lun 03/03/08	lun 01/12//08	NA	lun 21/04/08	100%
Realizzazione e test	lun 03/03/08	ven 02/05/08	NA	ven 02/05/08	75%
Milestone	gio 03/04/08	gio 03/04/08	NA	NA	0%
Rilascio	gio 03/04/08	mar 15/07/08	NA	NA	0%
Milestone	mar 15/07/08	mar 15/07/08	NA	NA	0%
INF2_Validazione	mar 15/07/08	lun 16/03/09	mar 15/07/08	lun 16/03/09	0%
INF2_Monitoraggio	lun 16/03/09	mer 15/04/09	lun 16/03/09	mer 15/04/09	0%

Riepilogo Task INF3

TASK	INIZIO	FINE	INIZIO Previsto	FINE Prevista	% COMPL.
INF3_AVVIO	lun 02/01/06	mar 02/05/06	lun 02/01/06	mar 02/05/06	100%
INF3_APPROFONDIMENTO	mar 02/05/06	lun 31/12/07	mar 02/05/06	mer 01/08/07	100%
INF3_REALIZZAZIONE	ven 01/06/07	mar 10/03/09	ven 01/06/07	lun 02/03/09	94%
Relazizzaz. Reference implementation	ven 01/06/07	lun 31/03/08	ven 01/06/07	lun 03/03/08	100%
Realizzaz. Implementazioni regionali	ven 01/06/07	mar 10/03/09	lun 03/03/08	lun 02/03/09	75%
INF3_COMPLETAMENTO	mar 01/01/08	gio 31/12/09	mar 01/01/08	lun 01/06/09	50%
Dispiegamento Reference implementation	ven 01/08/08	gio 31/12/09	ven 01/08/08	lun 01/06/09	50%
Dispiegamento implementazioni regionali	ven 01/08/08	lun 01/06/08	ven 01/08/08	lun 01/06/09	50%

Riepilogo Task AP 1

TASK	INIZIO	FINE	INIZIO Previsto	FINE Prevista	% COMPL.
AP 1_ANALISI PRELIMINARE	mer 17/05/06	mer 20/06/07	mer 17/05/06	gio 01/02/07	100%
AP1_PROGETTAZIONE	ven 30/03/07	lun 26/11/07	gio 01/02/07	lun 02/07/07	100%
AP1_SVILUPPO	mar 20/11/07	lun 01/09/08	lun 02/07/07	gio 01/05/08	100%
AP1_TEST VALIDAZIONE	lun 03/03/08	gio 30/04/09	lun 03/03/08	lun 01/09/08	75%
Test validazione	lun 03/03/08	gio 30/10/08	lun 03/03/08	lun 01/09/08	75%
Milestone 3	lun 01/09/08	lun 30/04/09	lun 01/09/08	lun 01/09/08	100%
AP1_MESSA IN ESERCIZIO	mer 01/04/08	mar 30/06/09	lun 01/09/08	mer 01/04/09	0%

Riepilogo Task AP 3

TASK	INIZIO	FINE	INIZIO Previsto	FINE Prevista	% COMPL.
AP 3_ GESTIONE PROGETTO	gio 01/02/07	ven 01/05/09	gio 01/02/07	ven 01/05/09	80%
Gestione di progetto_A1.1_Coordinamento operativo; A1.2_Activazione convenzione; A1.3_Appalto e forniture; A1.4_Monitoraggio e coordinamento	gio 01/02/07	ven 01/05/09	gio 01/02/07	gio 01/05/08	80%
AP3_ANALISI E PROGETTAZIONE	gio 01/02/07	lun 03/09/07	gio 01/02/07	lun 03/09/07	100%
AP3_REALIZZAZIONE	mar 04/09/07	lun 31/03/08	lun 03/09/07	ven 01/02/08	100%
Progetto esecutivo, ADS per notifica variazioni IPA, ADS per servizi doc, ontologie, estensione segnature	mar 04/09/07	lun 31/03/08	mar 04/09/07	ven 01/02/08	100%
AP3_INTERFACCIAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI APPLICATIVI REGIONALI	mar 02/09/08	lun 01/12/08	lun 04/02/08	ven 02/05/08	75%
Interfacciamento ed adeguamento applicativi regionali	mar 02/09/08	lun 01/12/08	lun 04/02/08	lun 01/12/08	75%
Milestone 2	lun 01/12/08	lun 01/12/08	gio 01/05/08	gio 01/05/08	0%
AP3_SPERIMENTAZIONE ESERCIZIO	mer 02/04/08	mer 31/03/09	lun 03/12/07	lun 01/09/08	70%
Sperimentazione esercizio e formazione	mer 02/04/08	mer 31/12/08	lun 03/12/07	mer 31/12/08	70%
Milestone 3	mer 31/12/08	mer 31/12/08	lun 01/09/08	lun 01/09/08	0%
AP3_GESTIONE IN ESERCIZIO	ven 28/11/08	mar 30/06/09	mer 01/10/08	ven 01/05/09	25%

Riepilogo Task AP 4

TASK	INIZIO	FINE	INIZIO Previsto	FINE Prevista	% COMPL.
AP 4_GESTIONE DI PROGETTO	ven 26/01/07	ven 01/05/09	gio 01/02/07	ven 01/05/09	80%
Gestione di progetto_A1.1_Coordinamento operativo; A1.2_Activazione convenzione; A1.3_Appalto e forniture; A1.4_Monitoraggio e coordinamento	ven 26/01/07	ven 01/05/09	gio 01/02/07	ven 01/05/09	80%
Milestone 1	sab 27/01/07	sab 27/01/07	gio 01/02/07	gio 01/02/07	100%
AP4_DEFINIZIONE ACCORDI DI SERVIZIO	ven 30/11/07	lun 30/06/08	ven 01/06/07	ven 31/08/07	100%
AP4_DEFINIZIONE ONTOLOGIE	ven 01/06/07	lun 30/06/08	ven 01/06/07	ven 30/11/07	100%
AP4_ANALISI E PROGETTAZIONE	lun 05/11/07	ven 30/05/08	lun 04/06/07	mer 31/10/07	100%
AP4_INTERFACCIAMENTO E ADEGUAMENTO APPLICATIVI	mar 01/07/08	lun 01/12/08	ven 02/11/07	ven 01/02/08	45%
Interfacciamento e adeguamento	mar 01/07/08	gio 30/04/09	ven 02/11/07	gio 31/01/08	45%
Milestone 5	lun 01/12/08	gio 30/04/09	ven 01/02/08	ven 01/02/08	0%
AP4_SPERIMENTAZIONE E FORMAZIONE	gio 30/04/09	mar 30/06/09	ven 01/02/08	lun 12/05/08	10%
AP4_GESTIONE IN ESERCIZIO	mer 02/07/08	mar 30/06/09	lun 05/05/08	ven 01/05/09	0%

Riepilogo Task AP 5

TASK	INIZIO	FINE	INIZIO Previsto	FINE Prevista	% COMPL.
AP5_AVVIO	gio 01/06/06	ven 04/05/07	gio 01/06/06	mer 30/04/08	100%
AP5_APPROFONDIMENTO	lun 16/04/07	lun 16/07/07	gio 01/03/07	lun 30/04/07	100%
AP5_REALIZZAZIONE	ven 03/08/07	lun 31/12/07	mar 01/05/07	lun 31/12/07	100%
AP5_COMPLETAMENTO	lun 16/06/08	lun 01/12/08	mar 01/01/08	mer 30/04/08	100%

Riepilogo Task AP 6

TASK	INIZIO	FINE	INIZIO Previsto	FINE Prevista	% COMPL.
AP6_GESTIONE PROGETTO	ven 19/05/06	gio 30/04/09	ven 19/05/06	gio 30/04/09	81%
Gestione progetto	ven 19/05/06	gio 30/04/09	ven 19/05/06	gio 30/04/09	75%
Pianificazione di dettaglio	ven 19/05/06	mer 21/03/07	ven 19/05/06	dom 31/12/06	100%
AP6_ANALISI	mer 01/11/06	gio 24/05/07	mer 01/11/06	ven 09/03/07	100%
AP6_MODELLAZIONE E DEFINIZIONE ARCHITETTURA	mar 13/03/07	gio 08/11/07	mar 13/03/07	ven 29/06/07	100%
AP6_MODELLO ORGANIZZATIVO DI SVILUPPO	mer 01/11/06	mar 15/01/08	mer 01/11/06	ven 29/06/07	76%
Definizione degli accordi operativi	mer 01/11/06	mar 15/01/08	mer 01/11/06	lun 15/10/07	75%
Milestone_AST	lun 15/10/07	gio 08/11/07	ven 29/06/07	ven 29/06/07	100%
AP6_PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE	lun 24/09/07	lun 08/06/09	lun 02/07/07	ven 01/02/08	73%
Mock-up e validazione	lun 15/10/07	lun 31/03/08	lun 01/10/07	ven 09/11/07	100%
Progettazione esecutiva e portale interregionale	gio 15/11/07	lun 08/06/09	lun 22/10/07	lun 28/07/08	75%
Progettazione esecutiva della Reference implementation	ven 09/11/07	lun 31/03/08	lun 01/10/07	ven 30/11/07	100%
Realizzazione della implementazione PDD applicativa	lun 31/03/08	mer 31/12/08	lun 31/12/07	ven 10/10/08	100%
Realizzazione della implementazione PDD delegata	lun 31/03/08	mer 31/12/08	lun 31/12/07	ven 10/10/08	100%
Adeguamento sistemi regionali	lun 24/09/07	mer 30/07/08	lun 24/09/07	ven 01/02/08	0%
AP6_TEST VALIDAZIONE	lun 30/04/07	mar 30/06/09	lun 30/04/07	gio 30/04/09	60%
Pianificazione test	mar 01/04/08	lun 25/05/09	lun 31/12/07	ven 31/10/08	75%
test della R.I	lun 01/09/08	lun 25/05/09	gio 10/07/08	ven 31/10/08	60%
test di validazione della implementazione intra-regionale	mar 30/09/08	lun 25/05/09	gio 14/08/08	lun 01/12/08	60%
test di validazione della implementazione tra-regionale	mar 30/09/08	mar 23/06/09	gio 04/09/08	lun 01/12/08	100%
Milestone_RMA	gio 31/07/08	mar 30/06/09	mer 30/04/08	mer 30/04/08	75%
Esercizio	lun 30/04/07	gio 30/04/09	lun 30/04/07	gio 30/04/09	0%

Riepilogo Task AP 7

TASK	INIZIO	FINE	INIZIO Previsto	FINE Prevista	% COMPL.
AP 7_GESTIONE PROGETTO	ven 01/12/06	mar 31/03/09	ven 01/12/06	mar 31/03/09	60%
AP7_EVOLUZIONE DB	lun 01/01/07	mar 31/03/09	lun 01/01/07	mar 31/03/09	76%
Analisi DB e identificazione interventi di sviluppo e potenziamento	lun 01/01/07	lun 31/12/07	lun 01/01/07	ven 28/09/07	100%
Progettazione, realizzazione e dispiegamento intereventi	lun 01/10/07	mar 31/03/09	lun 29/10/07	mar 31/03/09	60%
AP7_IMPLEMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	ven 01/12/06	mar 30/06/09	ven 01/12/06	mer 31/12/08	78%
Analisi di contesto	ven 01/12/06	ven 30/11/07	ven 01/12/06	mer 28/02/07	100%
Modellazione e progettazione	gio 15/03/07	mer 31/12/08	gio 15/03/07	ven 29/06/07	100%
Realizzazione	lun 02/07/07	mar 30/06/09	lun 02/07/07	mer 30/04/08	83%
Realizzazione	lun 02/07/07	mer 31/12/08	lun 02/07/07	lun 31/03/08	100%
Sviluppo moduli interfaccia sistemi regionali	mer 01/08/07	mar 30/06/09	lun 02/04/07	mer 30/04/08	75%
Milestone 3	mer 30/04/08	mar 30/06/09	mer 30/04/08	mer 30/04/08	75%
Validazione	lun 03/03/08	ven 31/10/08	lun 03/03/08	gio 31/07/08	0%
Dispiegamento	mar 01/07/08	mar 31/03/09	mar 01/07/08	mar 31/03/09	0%
AP7_RACCORDO CON ALTRI TASK	lun 02/04/07	mar 31/03/09	lun 02/04/07	lun 31/03/08	0%

Pianificazione attività di attivazione dei nuovi rilasci fino al 30 giugno 2009

Pianificazione dispiegamento nuovi rilasci

- ⚙️ Massima libertà alle singole Regioni.
- ⚙️ Massima tutela delle attività in corso e massima garanzia di dispiegamento della nuova infrastruttura, attraverso:
 - ⚙️ un gruppo di Regioni “sperimentatrici” che si rende disponibile ad effettuare nelle prossime 3 settimane l’installazione e verifica della nuova infrastruttura, in parallelo alla vecchia, permettendo quindi la continuazione dei test applicativi in corso;
 - ⚙️ 20 di maggio si condividerà l’esito della sperimentazione e si potrà pianificare il dispiegamento in tutte le Regioni della nuova infrastruttura e il contestuale abbandono della vecchia.
- ⚙️ Dichiarano la disponibilità a sperimentare da subito, in parallelo, la nuova infrastruttura le seguenti Regioni: Toscana, Emilia-Romagna, Puglia, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Trento e Valle d’Aosta. Tuttavia qualunque Regione può sperimentare da subito la nuova infrastruttura, concordando a partire dal 28 aprile con la Regione Toscana i test di interoperabilità.

Ipotesi del piano di attività del II semestre 2009

Stato dell'arte

- La sola Regione Liguria ha provveduto a formalizzare una proposta, in generale si segnala l'opportunità che per Inf2 e per Inf3 siano garantiti servizi di assistenza meno condizionati dai tempi e maggiormente orientati ad un supporto progettuale, mentre per Inf1 si sottolinea l'importanza dei tempi di presa in carico e soluzione dei problemi eventualmente modulati per livelli e costi differenti.
- Le Regioni capofila INF entro il 30 aprile devono formulare la proposta che opportunamente raccordata verrà illustrata e approvata il 20 maggio nell'incontro infrastrutturali.

Extra-entrate finanziarie

TASK	ESTENSIONI			NUOVE ADESIONI				
	Valle d'Aosta	PAT	Campania	Molise	Calabria	PAB	Sicilia	
INF 1				8.824 €	8.824 €	8.824 €		
INF 2				8.824 €	8.824 €	8.824 €		
INF 3				8.824 €	8.824 €	8.824 €		
Ap1		8.824 €						
Ap2	8.824 €							
Ap3								
Ap4								
Ap5			8.824 €	8.824 €	8.824 €			
Ap6								
Ap7								
TOTALE	8.824 €	8.824 €	8.824 €	35.296 €	35.296 €	26.472 €		123.536 €

Comunicazione/Formazione (aggiornamento costi e iniziativa annuale 2009)

Formazione – stato dell'arte

Formazione online

- ⚙ Sono on line i tre moduli
- ⚙ In attesa delle correzioni dai responsabili dei task INF (sono stati attivati account personali)
- ⚙ Mancano nominativi dei partecipanti di alcune Regioni
- ⚙ A Maggio è prevista la partenza del corso

Formazione in presenza

- ⚙ Si ipotizzano due giornate nella prima o seconda settimana di Giugno a Roma
- ⚙ Stiamo lavorando con la società incaricata per la formazione innovativa
- ⚙ Le spese di trasferta e alloggio per i Focal point ICARplus saranno a carico del progetto
- ⚙ Verranno rilasciati degli attestati di frequenza.

Eventi

Forumpa

- ⚙ Ipotesi “piazza delle Regioni” non approvata da CPSI
- ⚙ Due convegni sulle azioni interregionali e sulla circolarità anagrafica

Evento annuale icar

- ⚙ E' stata data la disponibilità della Regione Toscana per la realizzazione dell'evento a Firenze nei giorni 1 e 2 luglio, palazzo Congressi.
- ⚙ E' in via di definizione il programma dell'evento.

Altre azioni

- Realizzare e distribuire sul territorio, anche per supportare gli eventi locali ICARplus, nuovi DVD contenenti: Rapporto ICAR, ICARtoni, SPOTquiz, Spettacolo
- Realizzare e distribuire sul territorio, anche per supportare gli eventi locali ICARplus, nuove brochure che comunichino in maniera più efficace ed accattivante i due progetti
- Realizzare due giornate in presenza a seguito della fase on line del corso con relativo affitto della sala

Preventivo costi

ATTIVITA'	COSTO	STATO
Produzione e consegna nuovi dvd	€ 9.120 per 6300 DVD	Da approvare e liquidare entro giugno
Realizzazione grafica – stampa e consegna nuove brochure Icar/Icarplus	€ 2.904	Da approvare e liquidare entro giugno
Manutenzione, restyling grafico, creazione nuove sezioni sito progetto	€ 5.880	Da approvare e liquidare entro giugno
Affitto sala per formazione in presenza	€ 1200	Da approvare e liquidare entro giugno
Realizzazione formazione in presenza 2 giornate	€ 2.880	Da liquidare entro giugno
Realizzazione e messa on line tre moduli e-learning	€ 12.960	Da liquidare entro giugno
Servizi ARUBA per rinnovo mantenimento dominio www.Progettoicar.it e rinnovo virtual server	€ 960	Da approvare e liquidare entro giugno
Spedizioni nuovi DVD e brochure	€ 467,40	Da approvare e liquidare entro giugno
	TOTALE DA LIQUIDARE € 36.384	

Estensione comunità ICAR per INA/SAIA

- ❁ In merito alla richiesta di permettere l'accesso alle strutture tecniche dell'università di Tor Vergata a supporto del Ministero dell'interno per l'implementazione dei nuovi servizi INA/SAIA in logica di cooperazione, tutte le Regioni mostrano il pieno accordo, pertanto di affida a Walter Volpi il mandato di supportare nei prossimi giorni tale attività.

Richiesta terza tranche di finanziamento

_____, 00/00/2000

Prot. n. 0000/0000000

**Spett.le CNIPA
CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Via Isonzo, 21/B - 00198 ROMA

Oggetto: Richiesta di erogazione della III tranche di co-finanziamento per il progetto ICAR--

Relativamente al cofinanziamento attribuito al progetto "ICAR" dal Decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie (circa l'assegnazione dei fondi ai progetti selezionati con l'Avviso per "Lo sviluppo dei servizi infrastrutturali locali e SPC" - Linea 1); ed a seguito della stipulazione dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Società dell'Informazione, avvenuta tra questa Regione e/o Provincia e le Amministrazioni centrali competenti in data 00 ----- 2000;

si richiede

l'erogazione della III tranche di cofinanziamento di competenza di questa Regione ammontante ad Euro **000.000,00** - pari al 25% dell'importo complessivo del progetto "**denominazione regionale**" - a seguito del superamento della II verifica prevista dal piano delle verifiche del progetto "ICAR" e corrispondente a:

- qualificazione della Porta di dominio ICAR;
- collaudo della Porta di dominio regionale con le Regioni capofila dei task INF1 (Toscana) e INF 2 (Liguria).

Si allegano alla presente i seguenti documenti:

1. "Report risultati sessioni di Qualificazione della Porta di Dominio - Progetto ICAR" - pagg.1-5.
2. Verbali di collaudo dei servizi di interoperabilità tra Regione ----- e Regioni Toscana e Liguria gli aspetti infrastrutturali INF 1 e INF 2.

Per quanto afferisce l'azione A.2.2. "Analisi e Progettazione degli interventi per lo sviluppo di casi di studio applicativi" si comunica, altresì, che il CISIS ha già provveduto ad inviare a codesta amministrazione, in data 00/00/2000 con lettera n° prot. 0000, i documenti progettuali previsti per la:

- definizione dei contenuti informativi e dei formati di codifica standard dei messaggi per la comunicazione tra le applicazioni (AP1 - AP7).R1;
- analisi, progettazione del modulo integrativo di interfacciamento tra il sistema Interregionale e l'applicazione di competenza operante a livello (AP1 - AP7).R2;
- eventuale analisi e progettazione degli adattamenti dei servizi applicativi regionali, qualora l'intervento della singola Regione risultasse particolarmente significativo.

Nel restare a disposizione per qualunque chiarimento è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Fine
